



**AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC - MCAM
AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L.R. 24/2017**

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53



FASE:

DISCIPLINA:

PROGR:

REVISIONE:

PDC

PSC

03.04.2

rev00

OGGETTO:

PDC - URBANIZZAZIONI U1-U2

GANTT

FILE PDF: *PDC_PSC-03.04.2_rev00_GANTT.pdf*

00 29-01-2024

CODICE PROGETTO: **P1139-21**

FILE: *P1139 ADP tw*

REV. DATA

DESCRIZIONE

TIMBRI:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INTEGRATA:

PROSPAZIO
— ARCHITECTURE - ENGINEERING

PROSPAZIO S.C.a.r.l.

Via Regina Pacis, 86/b
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 91.94.34
info@prospazio.com
www.prospazio.com



COORDINAMENTO

ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

COMMITTENTE

ARCHITETTONICO

ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

SINDACO

GIANCARLO MUZZARELLI

STRUTTURE

ING. DANILO DALLARI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FREGNI

RUP

ING. BARBARA NEROZZI

ELETTRICO

ING. MAURIZIO MANZINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI

MEC-ANTINCENDIO

Per.Ind. PAOLO BURANI STUDIO BURANI-NOCETTI

DISEGNATORE:

SIMONE VENTURELLI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.

GEOLOGO

DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI


RESPONSABILE:

ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHILINEA S.R.L.


ACUSTICA

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).

Nome attività	Durata	26 Feb 24	04 Mar 24	11 Mar 24	18 Mar 24	25 Mar 24	01 Apr 24	08 Apr 24	15 Apr 24	22 Apr 24	29 Apr 24	06 Mag 24	13 Mag 24	20
Recinzione e apprestamenti del cantiere	15 g													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	10 g	Z1												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g				Z1									
Apprestamenti del cantiere	14 g													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	9 g				Z1									
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g						Z1							
Realizzazione OPERE PROPEDEUTICHE	68 g													
Tracciamento dell'asse di scavo	2 g							Z1						
Scavo a sezione obbligata	22 g							Z1						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	24 g												Z1	
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	15 g													
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	10 g													
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	2 g													
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	10 g													
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	2 g													
Conduttura elettrica	20 g													
Posa di conduttura elettrica	15 g													
Esecuzione di protezioni elettriche	8 g													
ILLUMINAZIONE E PULIZIA	107 g													
Realizzazione di impianto di messa a terra	7 g													
Posa di pali per pubblica illuminazione	6 g													
Montaggio di apparecchi illuminanti	7 g													
Pulizia di sede stradale	9 g													
Strada	74 g													
Sede stradale	27 g													
Formazione di rilevato stradale	9 g													
Formazione di fondazione stradale	7 g													
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g													
Posa di pavimenti per esterni in pietra	5 g													
Opere d'arte per lavori stradali	32 g													
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori	8 g													
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in l	5 g													
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	7 g													
Cordoli, zanelle e opere d'arte	6 g													
Realizzazione di marciapiedi	7 g													

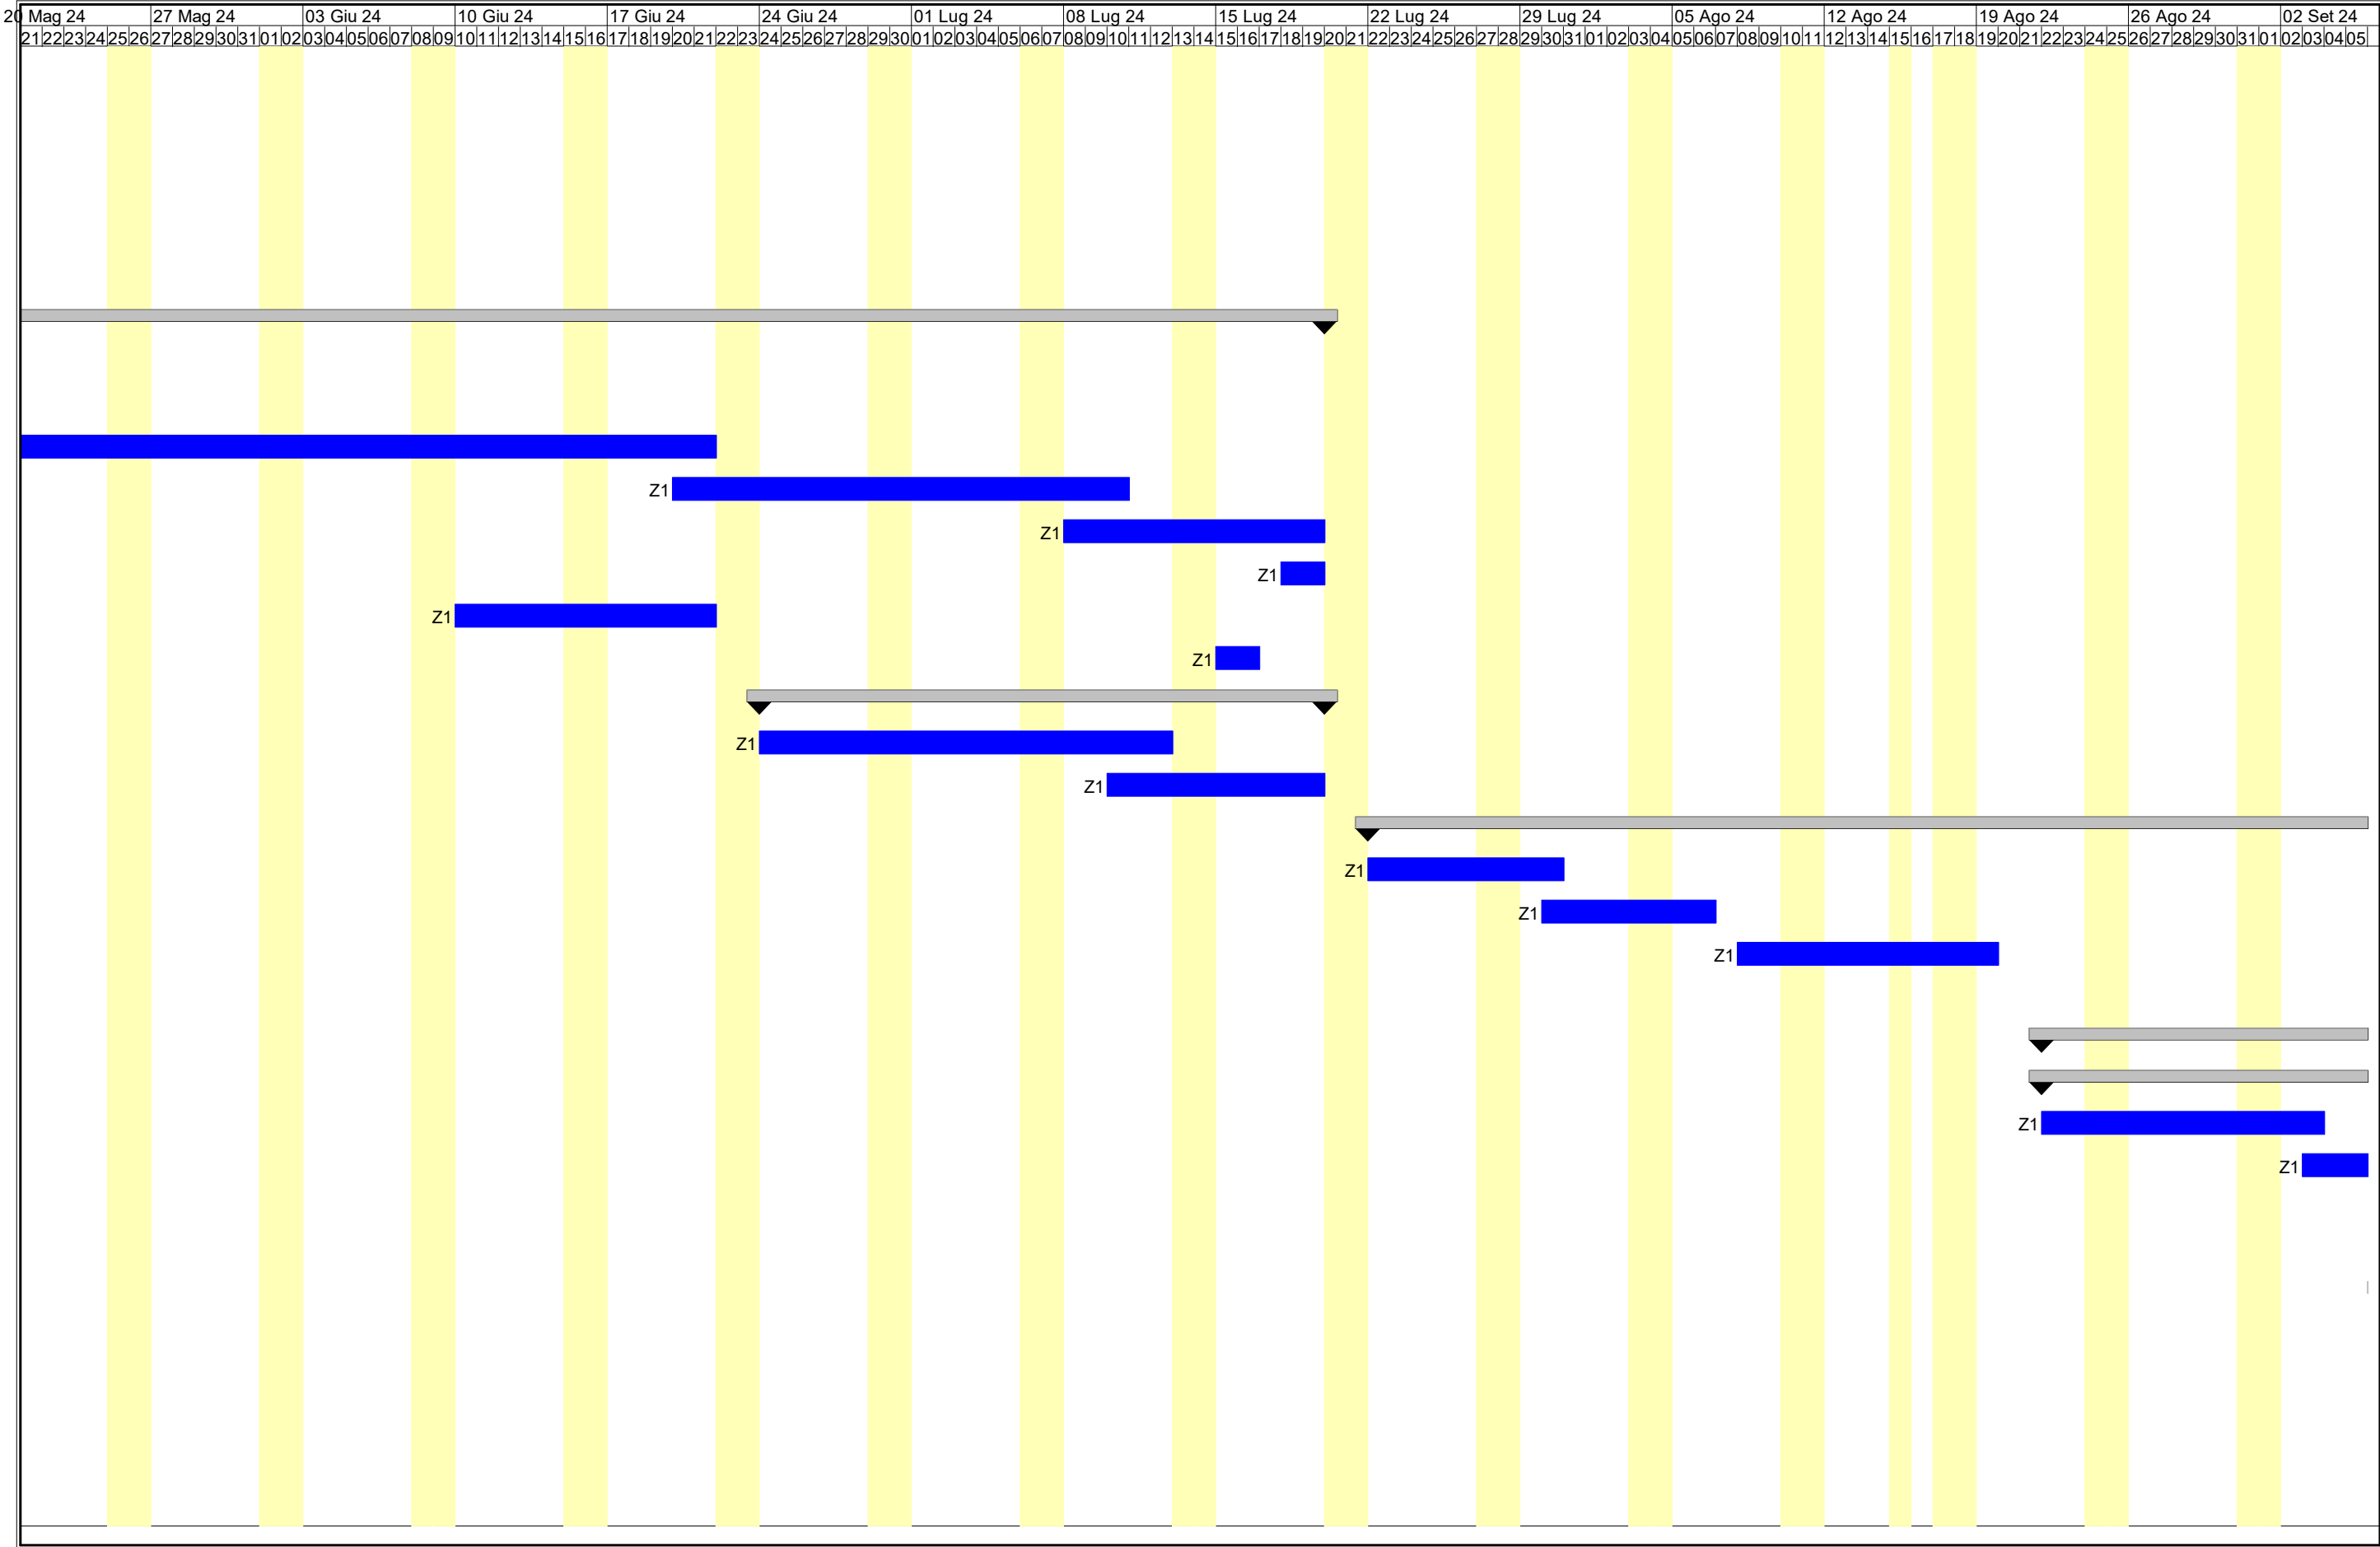

20	Mag 24				27 Mag 24				03 Giu 24				10 Giu 24				17 Giu 24				24 Giu 24				01 Lug 24				08 Lug 24				15 Lug 24				22 Lug 24				29 Lug 24				05 Ago 24				12 Ago 24				19 Ago 24				26 Ago 24				02 Set 24															
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05

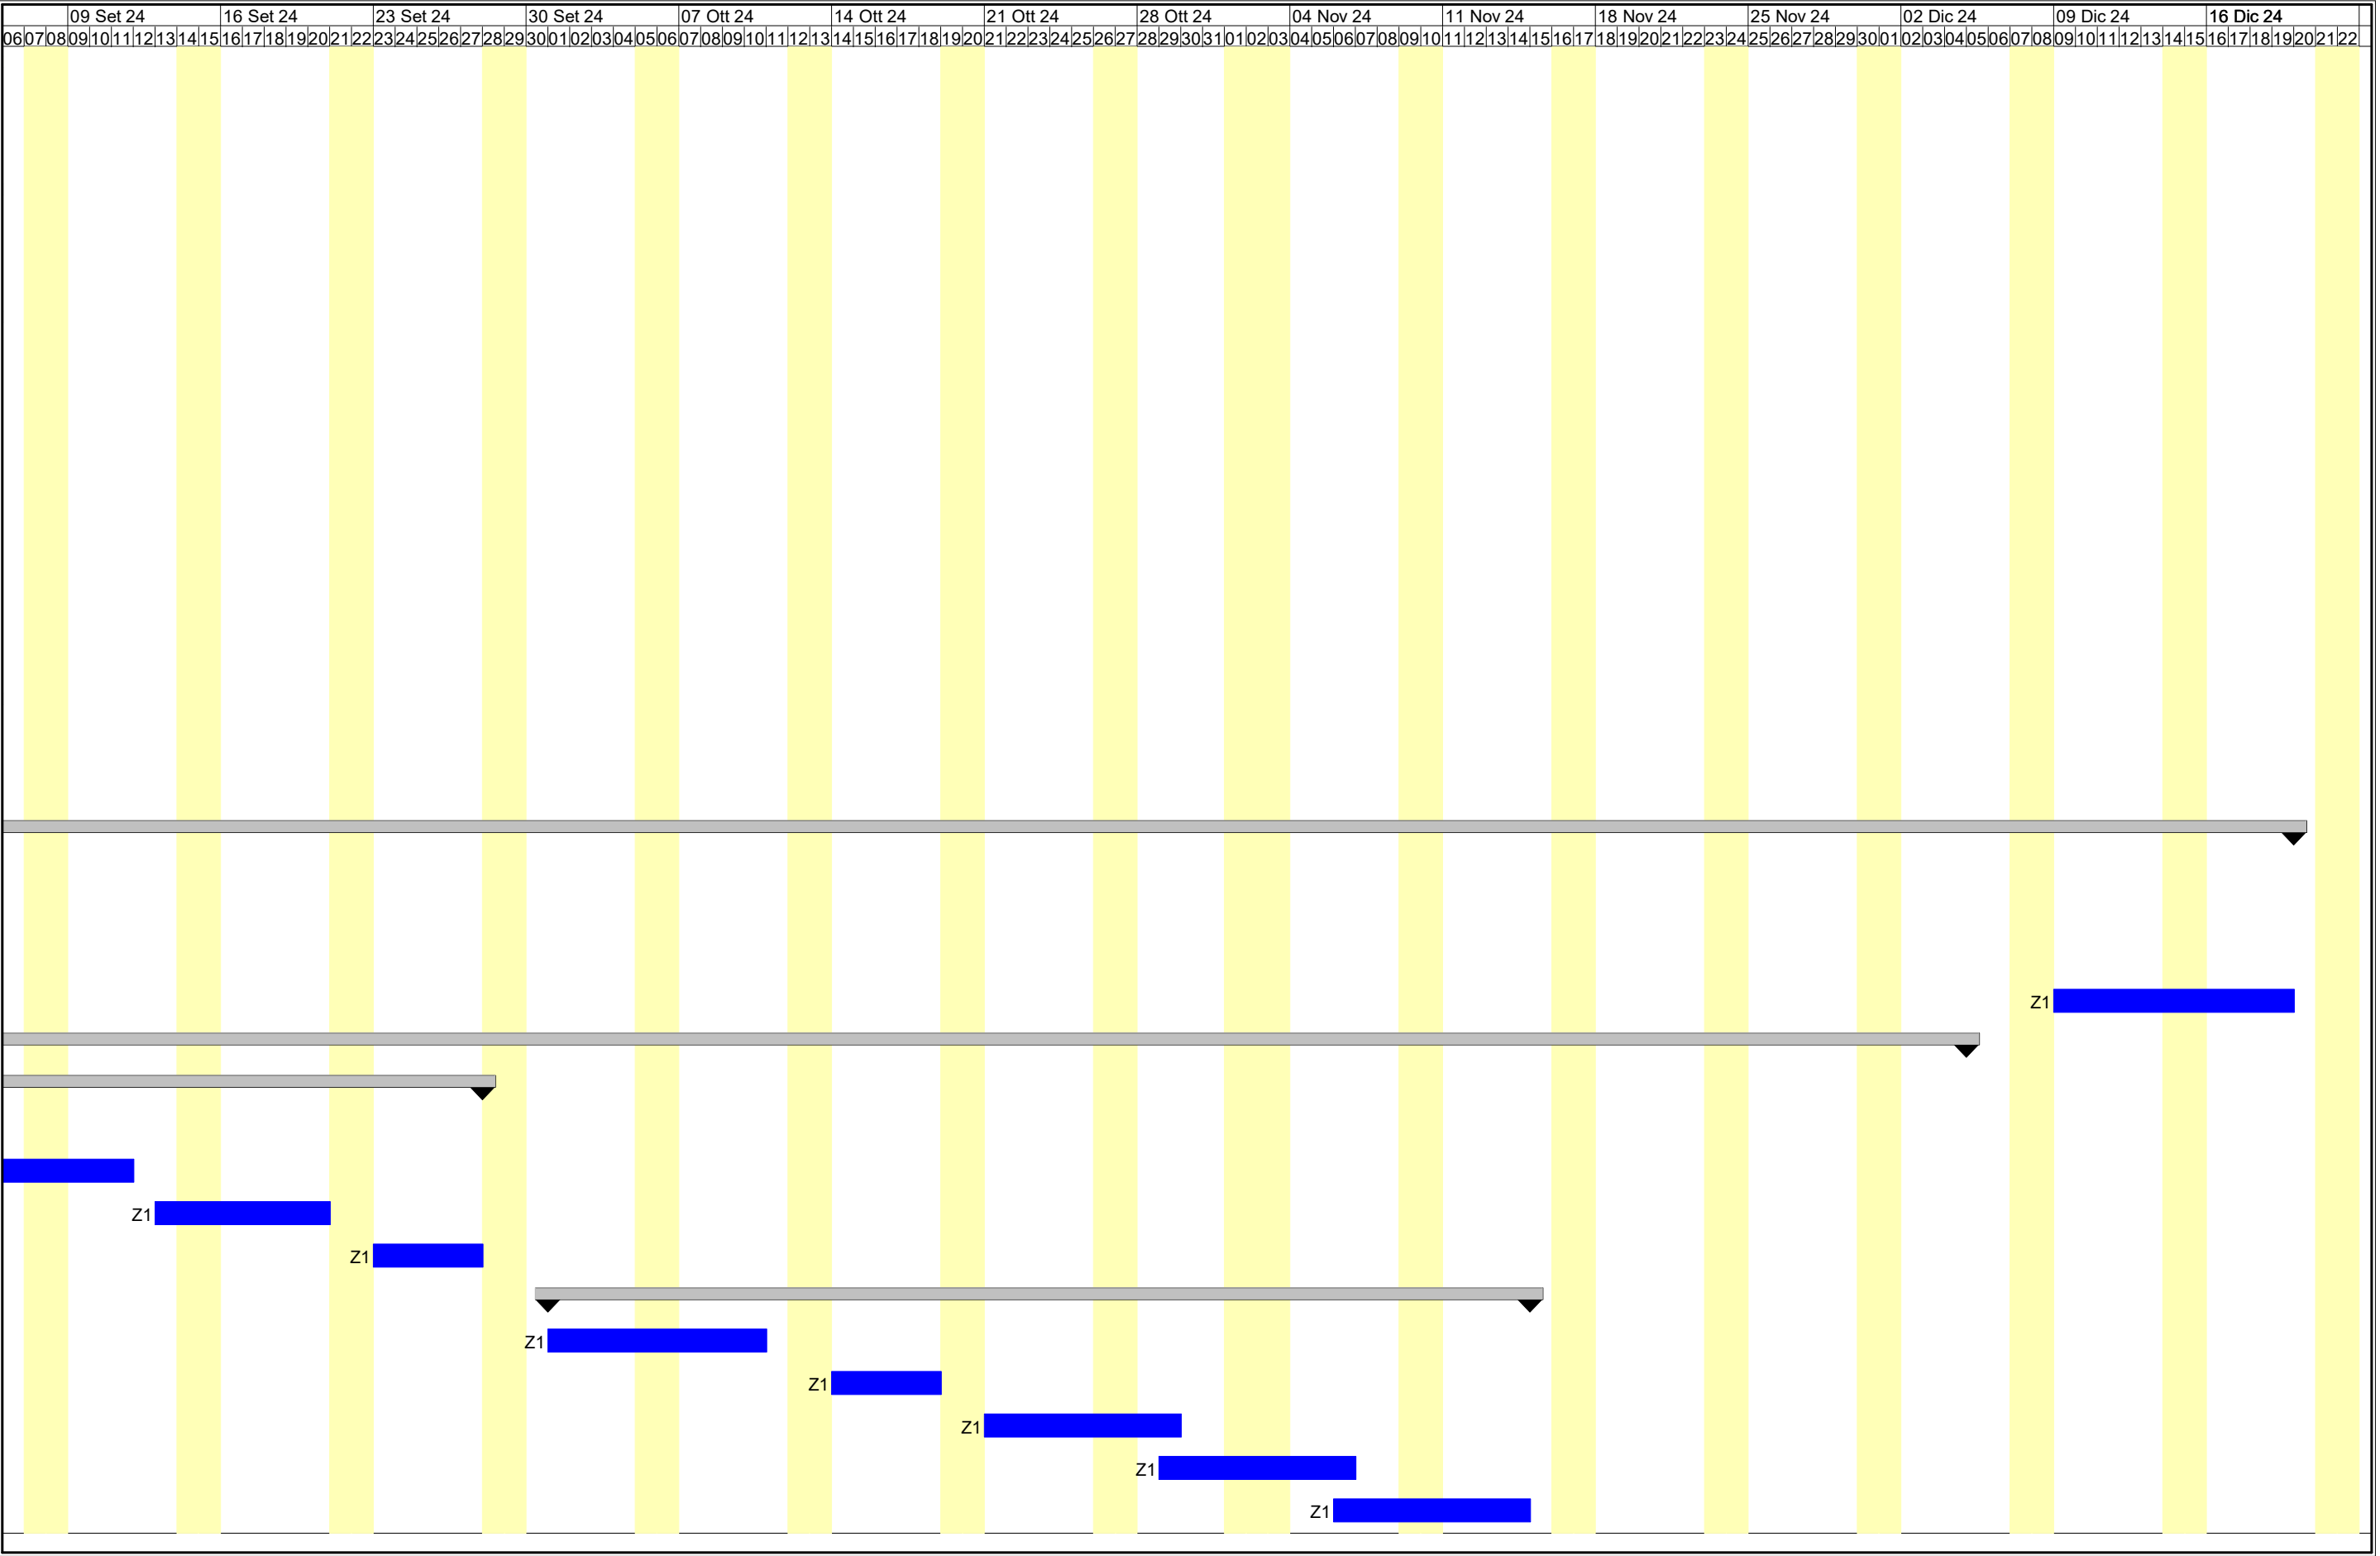



23 Dic 24			30 Dic 24			06 Gen 25			13 Gen 25			20 Gen 25			27 Gen 25			03 Feb 25			10 Feb 25			17 Feb 25			24 Feb 25			03 Mar 25			10 Mar 25			17 Mar 25			24 Mar 25			31 Mar 25			07 Apr 2		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09		

[illegible]
